



ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

COMUNE DI CEPAGATTI


Provincia di Pescara


LAVORI PER LA DISMISSIONE FOSSE IMHOFF NELLE FRAZIONI DI RAPATTONI
SUPERIORE, CASONI E CIAFALINO - 2° LOTTO
"INTERVENTO IN VIA MICHELANGELO"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Allegato G
ottobre 2024			
<div>PROGETTAZIONE</div> <div>- Ufficio Tecnico -</div> <div>Geom. Cesare Ortolano</div> <div>Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio</div>		<div>OGGETTO:</div> <div>CRONOPROGRAMMA</div> <div>(D.Lgvo n.36/2023 art. 18 allegato I.7)</div>	

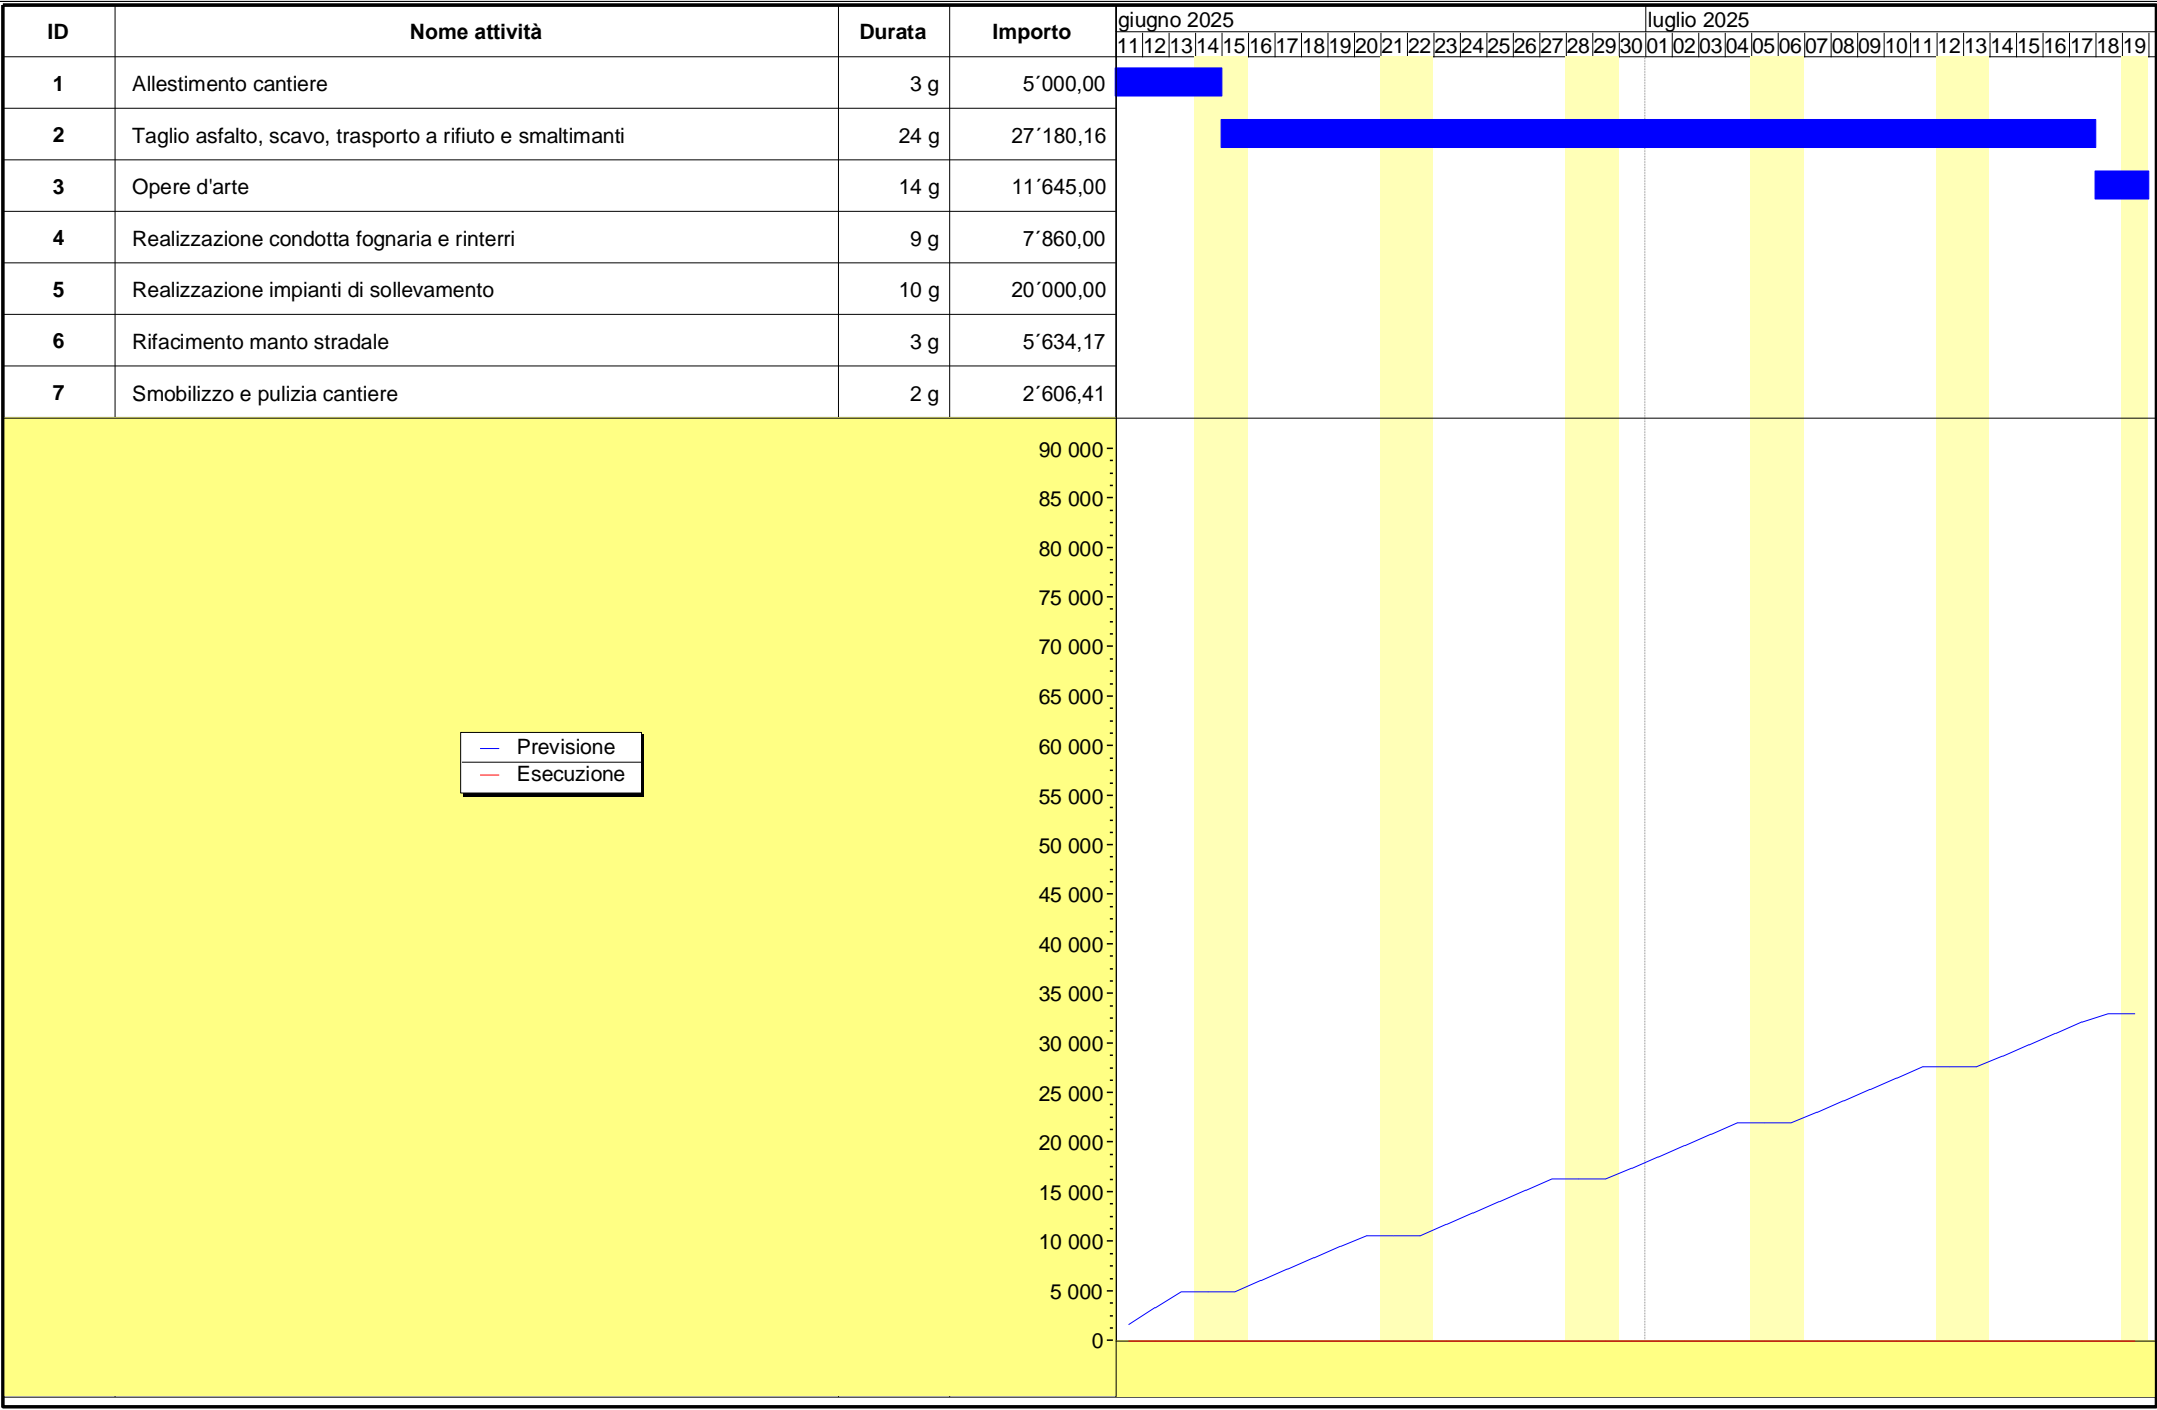

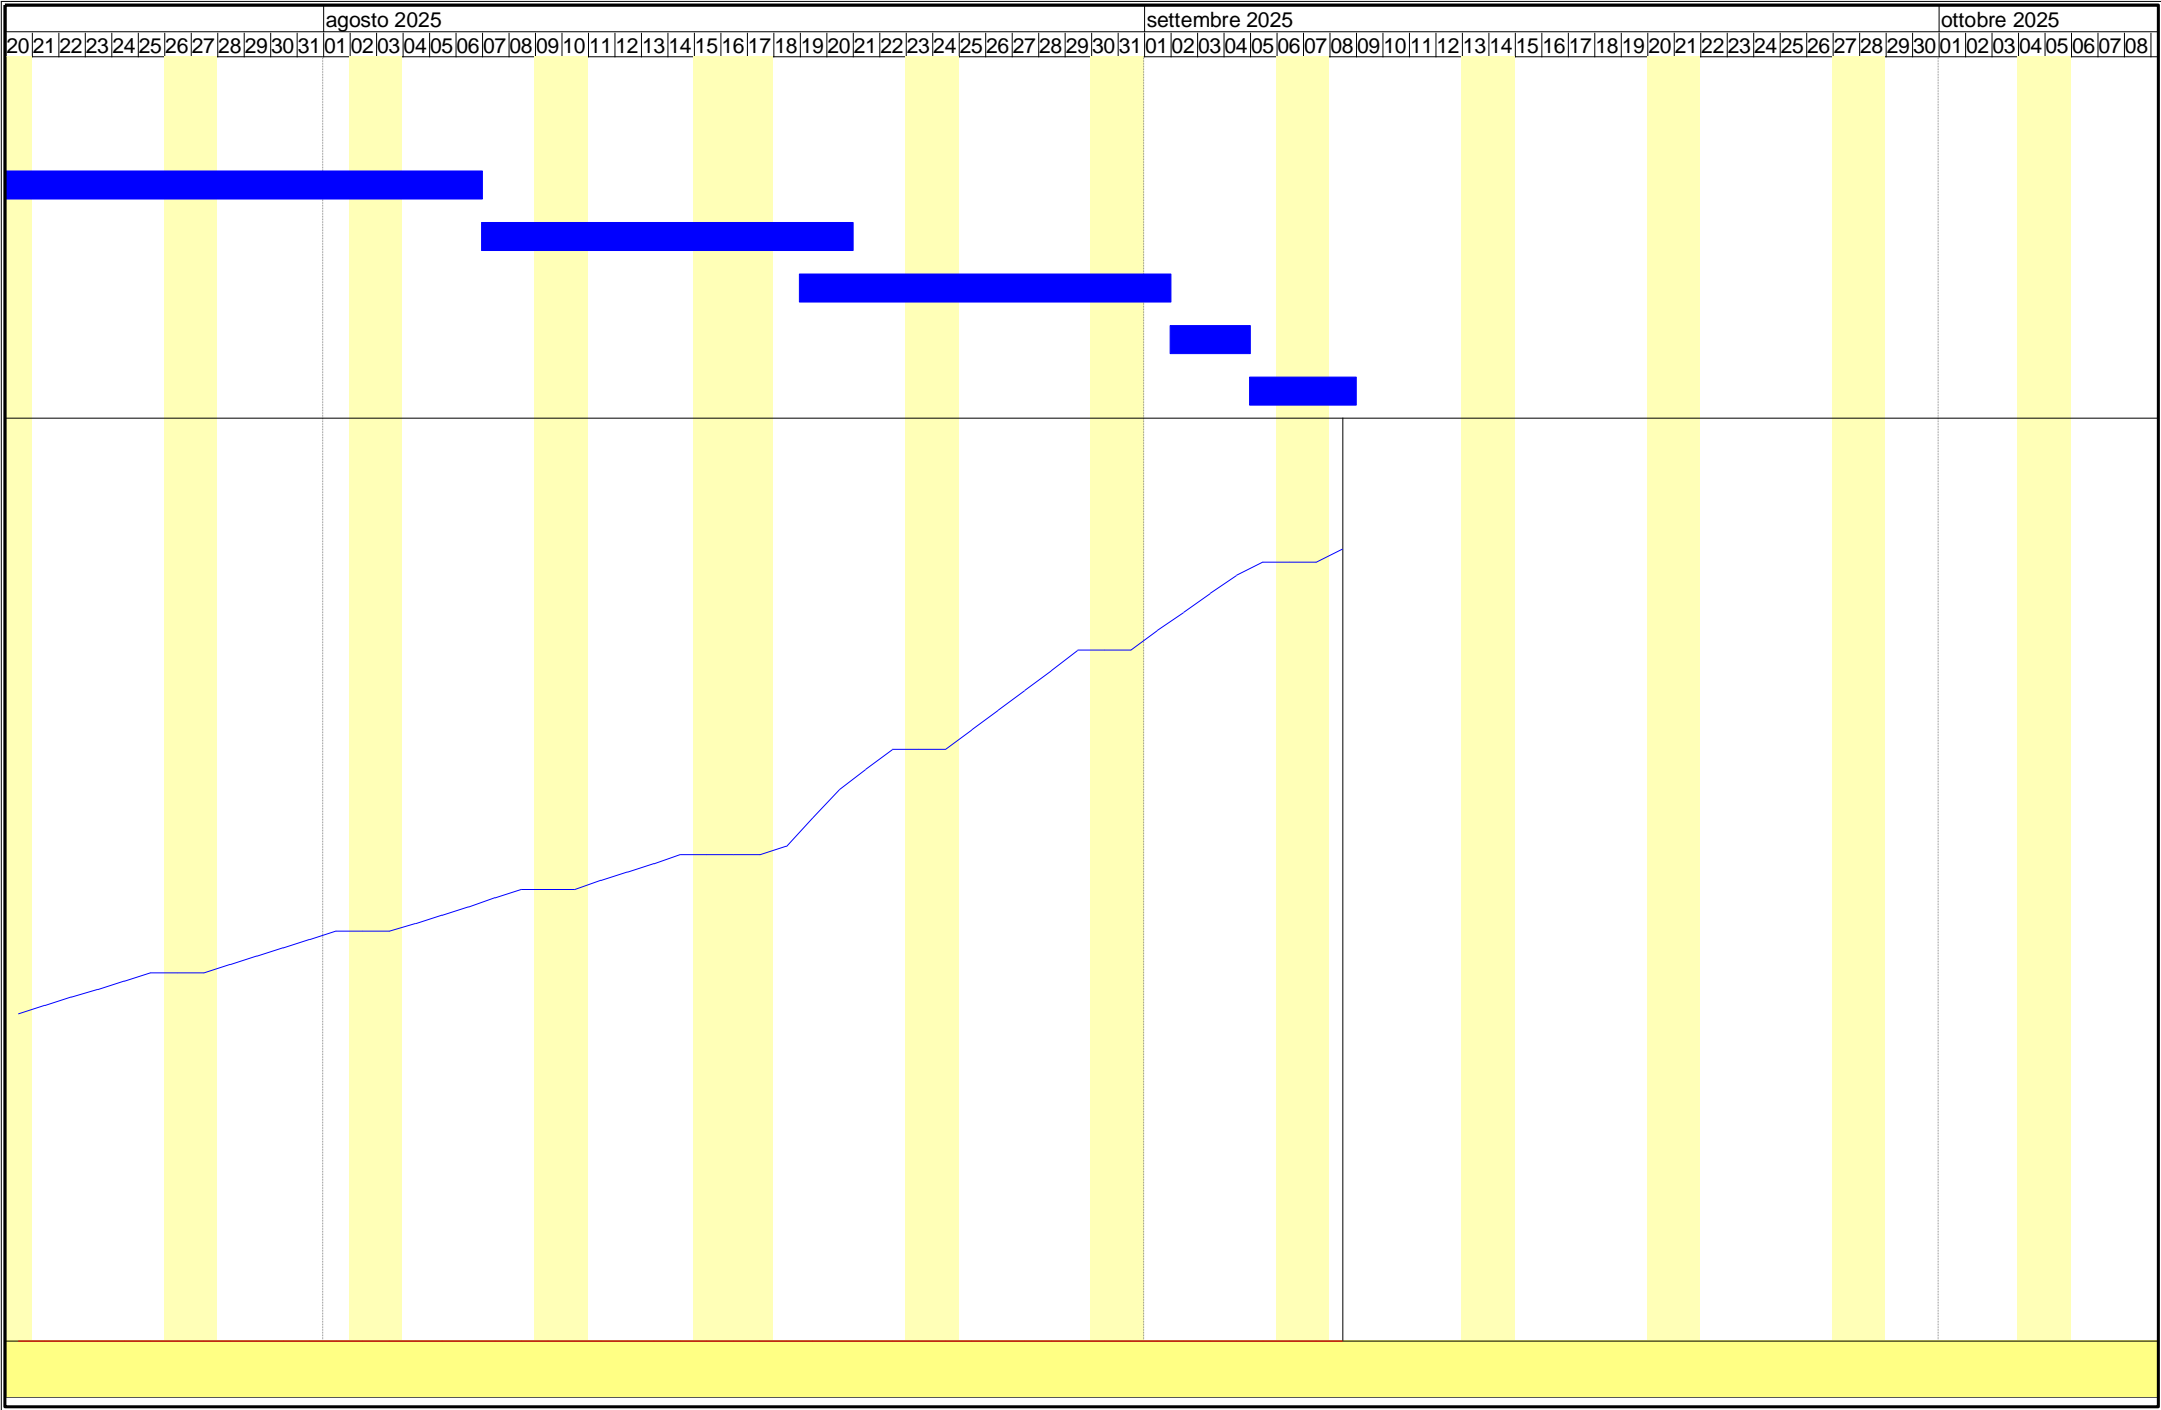

Comune di Cepagatti

Provincia di Pescara

Tabella Attività

OGGETTO: Realizzazione condotta fognaria via Michelangelo

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

Pescara, ottobre 2024

Il Progettista

Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	5'000,00	6,26	11/06/2025	14/06/2025	3	4
Taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto e smaltimanti	27'180,16	34,01	15/06/2025	17/07/2025	24	33
Opere d'arte	11'645,00	14,57	18/07/2025	06/08/2025	14	20
Realizzazione condotta fognaria e rinterri	7'860,00	9,83	07/08/2025	20/08/2025	9	14
Realizzazione impianti di sollevamento	20'000,00	25,02	19/08/2025	01/09/2025	10	14
Rifacimento manto stradale	5'634,17	7,05	02/09/2025	04/09/2025	3	3
Smobilizzo e pulizia cantiere	2'606,41	3,26	05/09/2025	08/09/2025	2	4
Pescara, ottobre 2024						
Il Progettista						
Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio						

Comune di Cepagatti

Provincia di Pescara

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Realizzazione condotta fognaria via Michelangelo

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

Pescara, ottobre 2024

Il Progettista

Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
11/06/2025	1'666,67	1'666,67	2,09
12/06/2025	1'666,67	3'333,33	4,17
13/06/2025	1'666,67	5'000,00	6,26
16/06/2025	1'132,51	6'132,51	7,67
17/06/2025	1'132,51	7'265,01	9,09
18/06/2025	1'132,51	8'397,52	10,51
19/06/2025	1'132,51	9'530,03	11,92
20/06/2025	1'132,51	10'662,53	13,34
23/06/2025	1'132,51	11'795,04	14,76
24/06/2025	1'132,51	12'927,55	16,17
25/06/2025	1'132,51	14'060,05	17,59
26/06/2025	1'132,51	15'192,56	19,01
27/06/2025	1'132,51	16'325,07	20,43
30/06/2025	1'132,51	17'457,57	21,84
01/07/2025	1'132,51	18'590,08	23,26
02/07/2025	1'132,51	19'722,59	24,68
03/07/2025	1'132,51	20'855,09	26,09
04/07/2025	1'132,51	21'987,60	27,51
07/07/2025	1'132,51	23'120,11	28,93
08/07/2025	1'132,51	24'252,61	30,34
09/07/2025	1'132,51	25'385,12	31,76
10/07/2025	1'132,51	26'517,63	33,18
11/07/2025	1'132,51	27'650,13	34,59
14/07/2025	1'132,51	28'782,64	36,01
15/07/2025	1'132,51	29'915,15	37,43
16/07/2025	1'132,51	31'047,65	38,85
17/07/2025	1'132,51	32'180,16	40,26
18/07/2025	831,79	33'011,95	41,30
21/07/2025	831,79	33'843,73	42,34
22/07/2025	831,79	34'675,52	43,38
23/07/2025	831,79	35'507,30	44,43
24/07/2025	831,79	36'339,09	45,47
25/07/2025	831,79	37'170,87	46,51
28/07/2025	831,79	38'002,66	47,55
29/07/2025	831,79	38'834,45	48,59
30/07/2025	831,79	39'666,23	49,63
31/07/2025	831,79	40'498,02	50,67
01/08/2025	831,79	41'329,80	51,71
04/08/2025	831,79	42'161,59	52,75
05/08/2025	831,79	42'993,37	53,79
06/08/2025	831,79	43'825,16	54,83
07/08/2025	873,33	44'698,49	55,93
08/08/2025	873,33	45'571,83	57,02
11/08/2025	873,33	46'445,16	58,11
12/08/2025	873,33	47'318,49	59,20
13/08/2025	873,33	48'191,83	60,30
14/08/2025	873,33	49'065,16	61,39
18/08/2025	873,33	49'938,49	62,48

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
19/08/2025	2'873,33	52'811,83	66,08
20/08/2025	2'873,33	55'685,16	69,67
21/08/2025	2'000,00	57'685,16	72,17
22/08/2025	2'000,00	59'685,16	74,68
25/08/2025	2'000,00	61'685,16	77,18
26/08/2025	2'000,00	63'685,16	79,68
27/08/2025	2'000,00	65'685,16	82,18
28/08/2025	2'000,00	67'685,16	84,69
29/08/2025	2'000,00	69'685,16	87,19
01/09/2025	2'000,00	71'685,16	89,69
02/09/2025	1'878,06	73'563,22	92,04
03/09/2025	1'878,06	75'441,27	94,39
04/09/2025	1'878,06	77'319,33	96,74
05/09/2025	1'303,21	78'622,54	98,37
08/09/2025	1'303,21	79'925,74	100,00
Pescara, novembre 2024			
Il Progettista			
Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio			
