




ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara


COMUNE DI RAPINO
Provincia di Chieti

**REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DEVIAZIONE REFLUI DAL
DEPURATORE LUCINA AL DEPURATORE ZONA INDUSTRIALE**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Allegato G
settembre 2024			
<div>PROGETTAZIONE</div> <div>- Ufficio Tecnico -</div> <div>Geom. Cesare Ortolano</div> <div>Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio</div>		<div>OGGETTO:</div> <div>CRONOPROGRAMMA</div> <div>(D.Lgvo n.36/2023 art. 18 allegato I.7)</div>	

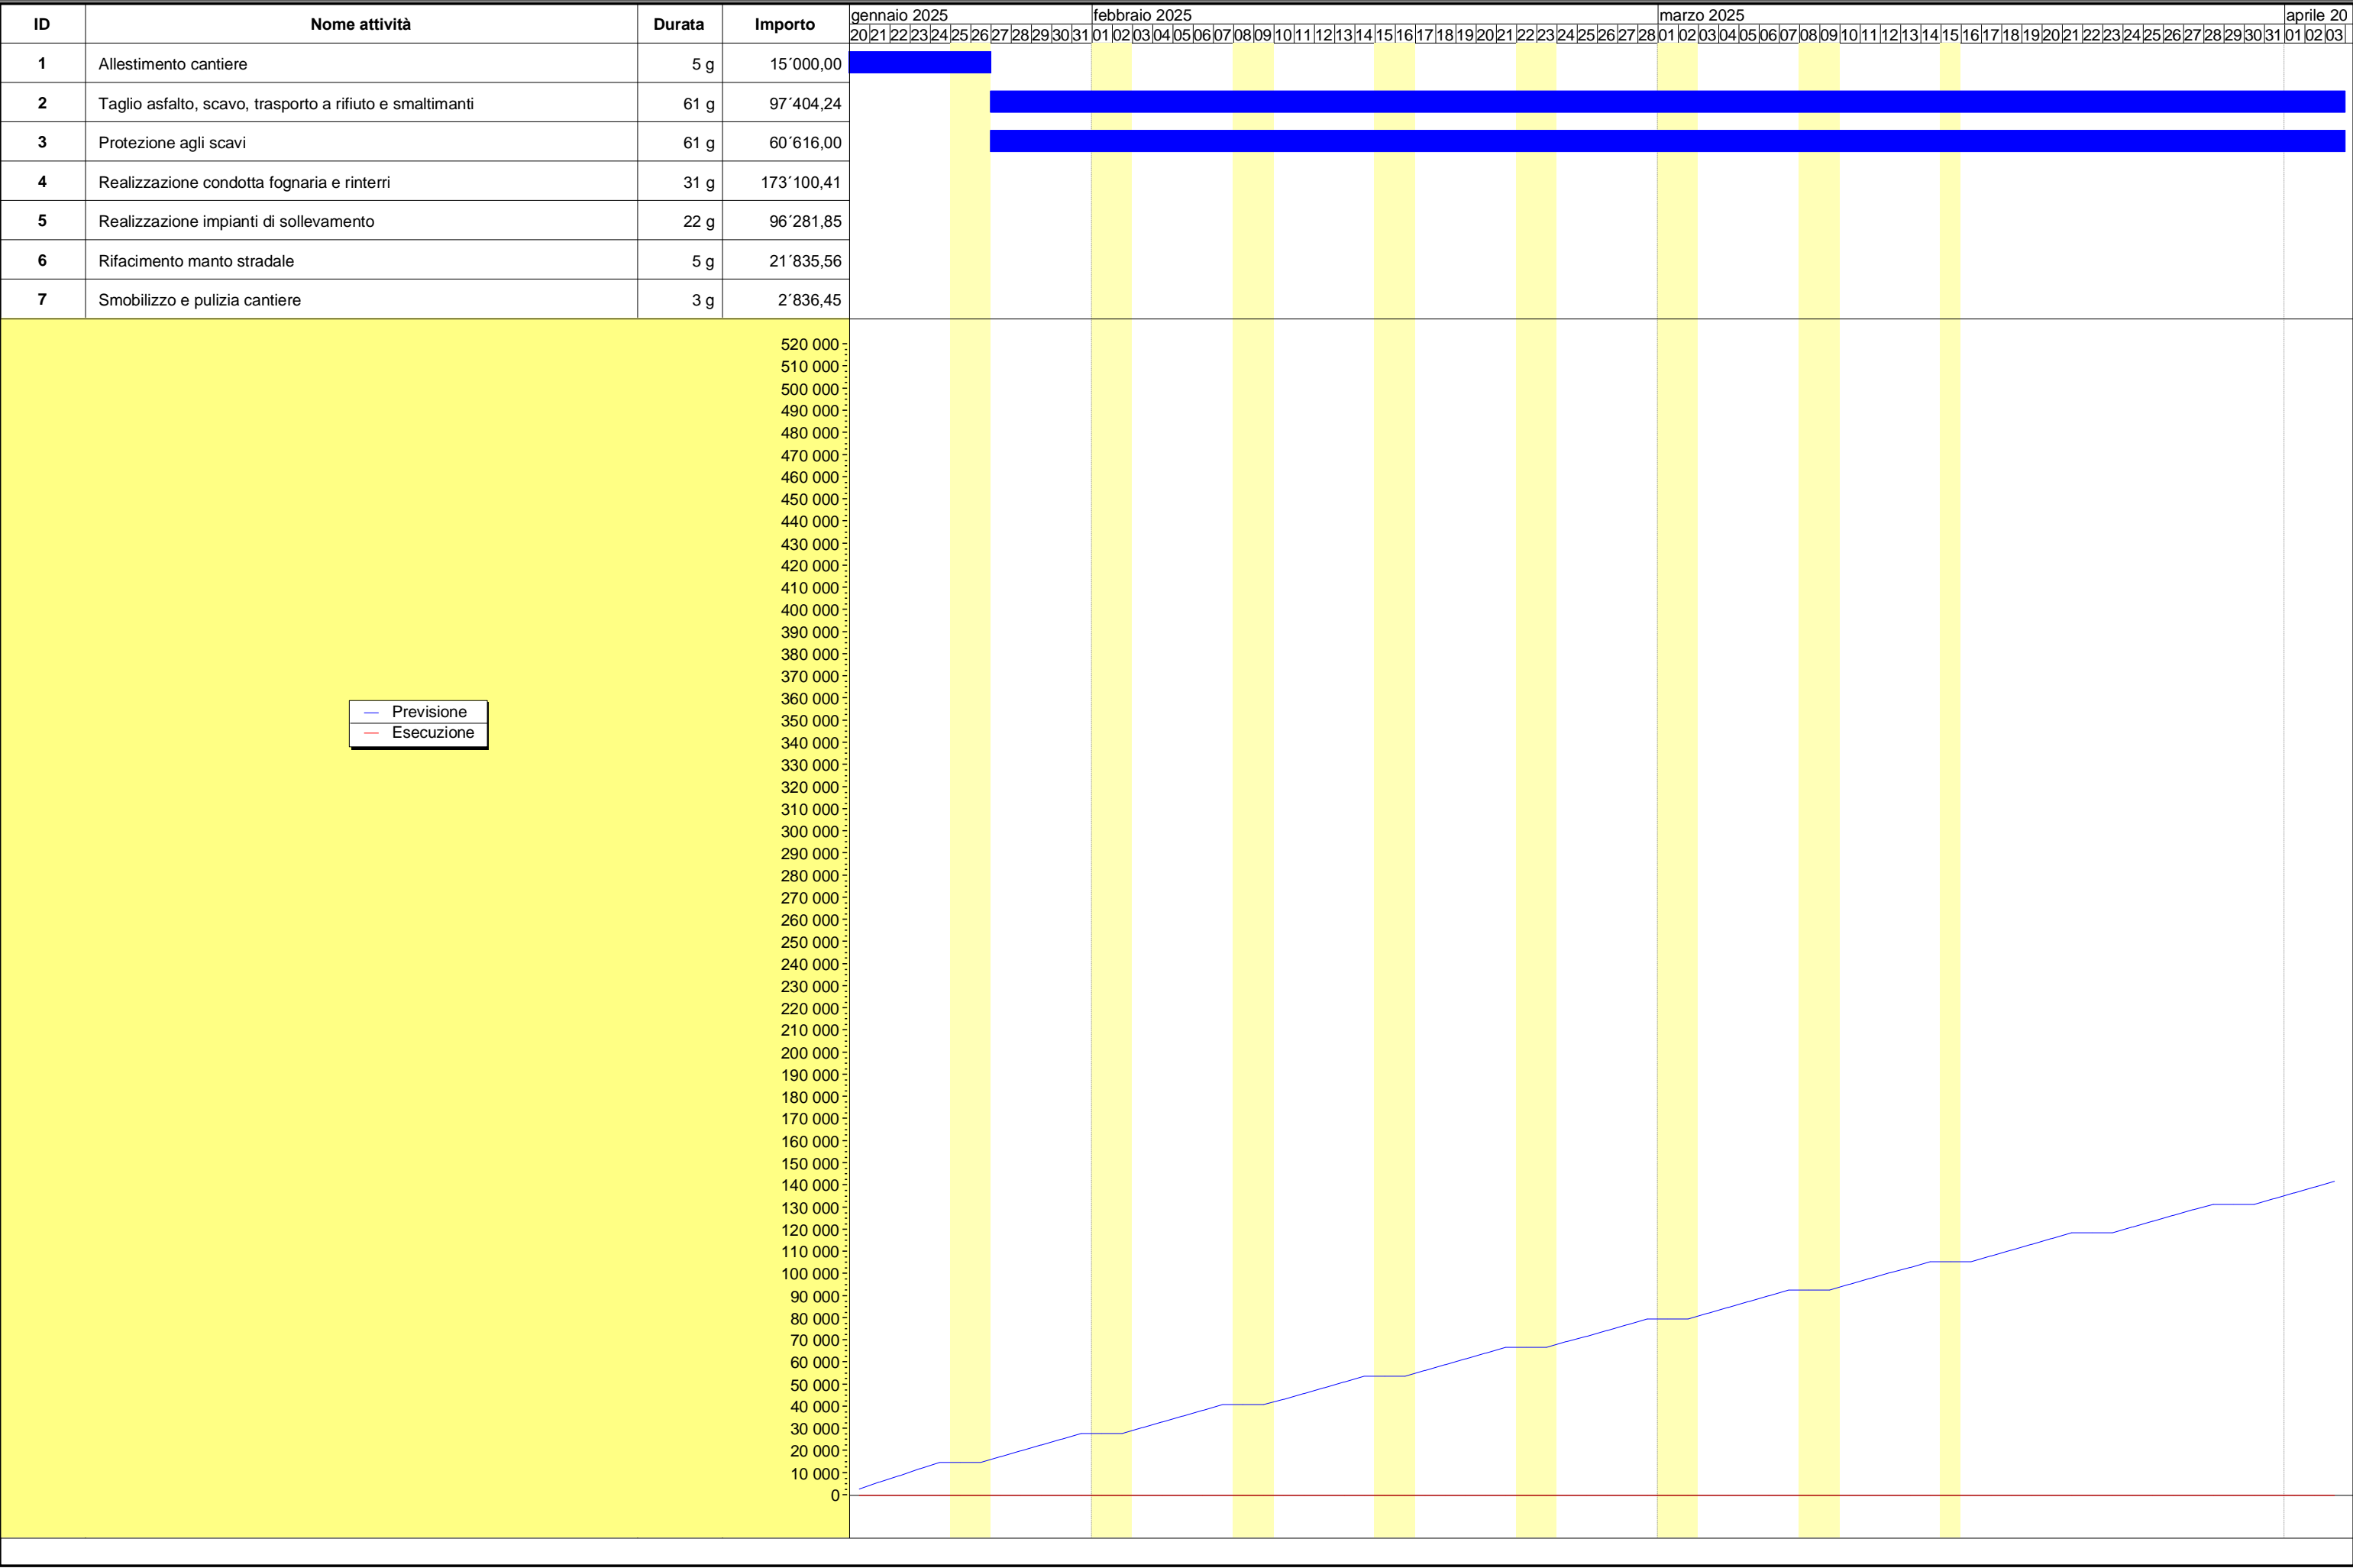

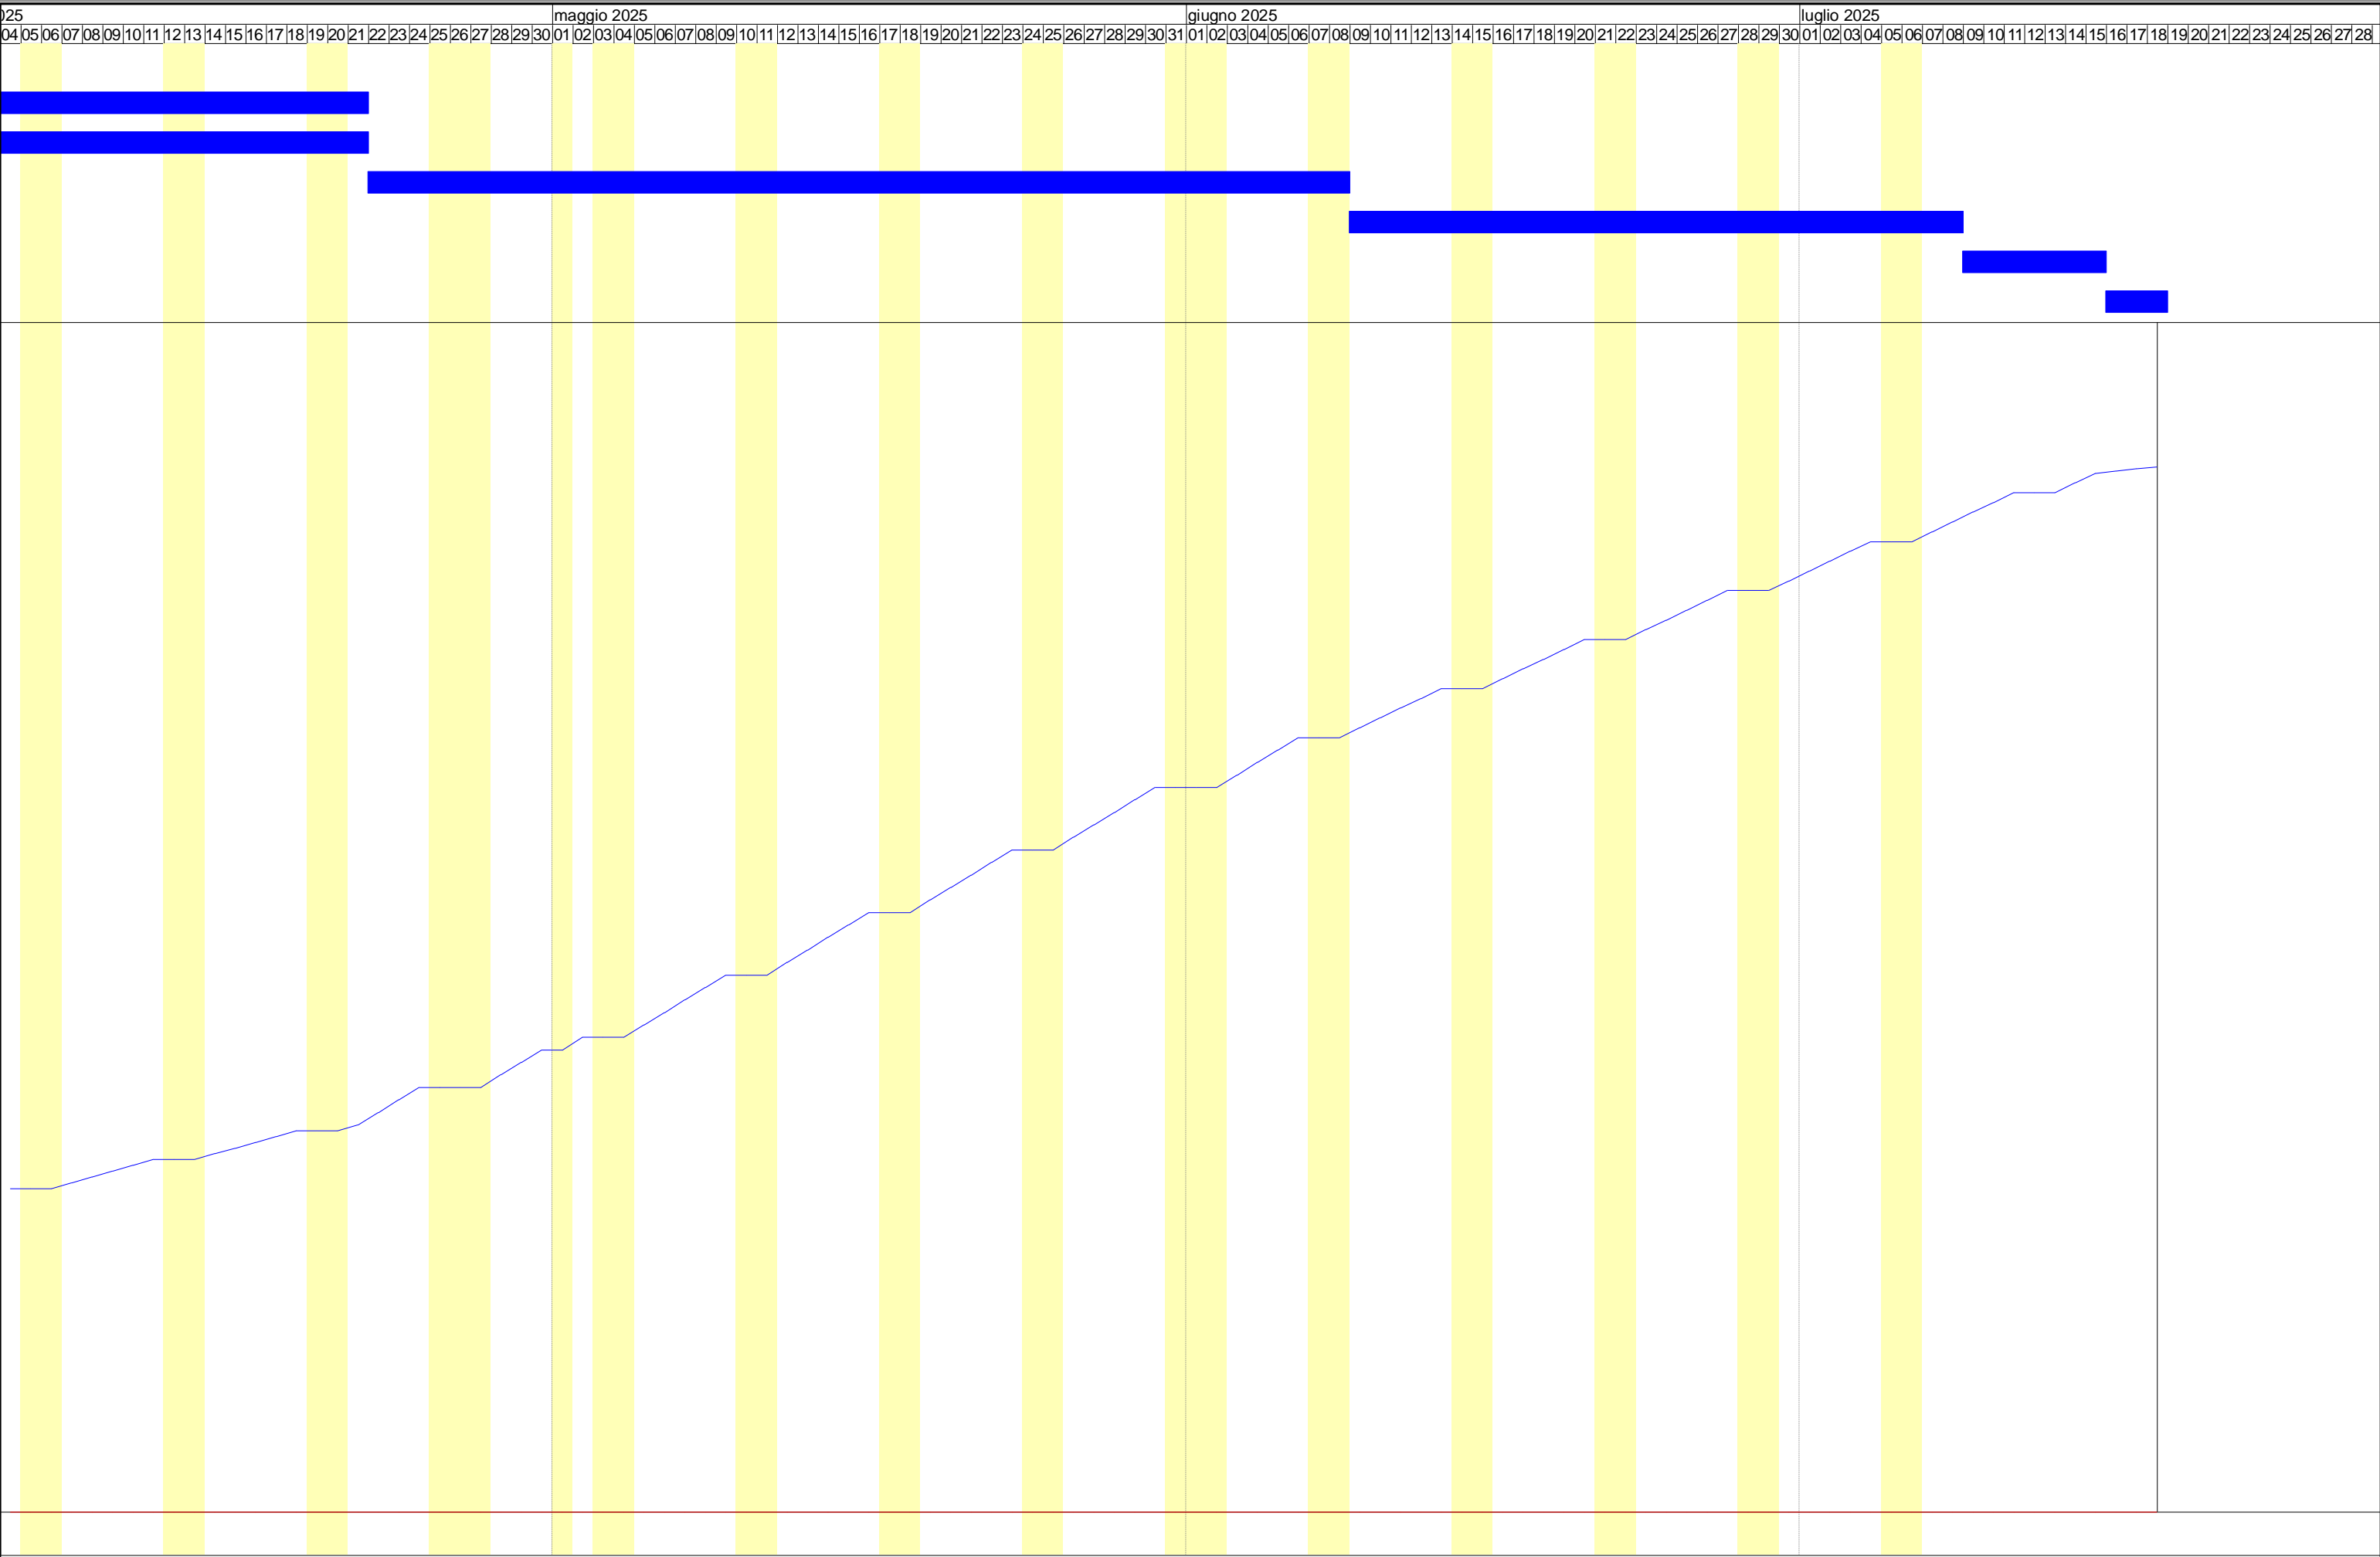

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	15'000,00	3,21	20/01/2025	26/01/2025	5	7
Taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto e smaltimanti	97'404,24	20,85	27/01/2025	21/04/2025	61	85
Protezione agli scavi	60'616,00	12,98	27/01/2025	21/04/2025	61	85
Realizzazione condotta fognaria e rinterri	173'100,41	37,06	22/04/2025	08/06/2025	31	48
Realizzazione impianti di sollevamento	96'281,85	20,61	09/06/2025	08/07/2025	22	30
Rifacimento manto stradale	21'835,56	4,67	09/07/2025	15/07/2025	5	7
Smobilizzo e pulizia cantiere	2'836,45	0,61	16/07/2025	18/07/2025	3	3
Pescara, settembre 2024						
Il Tecnico						
F.to Geom. Cesare Ortolano - F.to Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio						

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
20/01/2025	3'000,00	3'000,00	0,64
21/01/2025	3'000,00	6'000,00	1,28
22/01/2025	3'000,00	9'000,00	1,93
23/01/2025	3'000,00	12'000,00	2,57
24/01/2025	3'000,00	15'000,00	3,21
27/01/2025	2'590,50	17'590,50	3,77
28/01/2025	2'590,50	20'180,99	4,32
29/01/2025	2'590,50	22'771,49	4,88
30/01/2025	2'590,50	25'361,98	5,43
31/01/2025	2'590,50	27'952,48	5,98
03/02/2025	2'590,50	30'542,97	6,54
04/02/2025	2'590,50	33'133,47	7,09
05/02/2025	2'590,50	35'723,97	7,65
06/02/2025	2'590,50	38'314,46	8,20
07/02/2025	2'590,50	40'904,96	8,76
10/02/2025	2'590,50	43'495,45	9,31
11/02/2025	2'590,50	46'085,95	9,87
12/02/2025	2'590,50	48'676,44	10,42
13/02/2025	2'590,50	51'266,94	10,98
14/02/2025	2'590,50	53'857,44	11,53
17/02/2025	2'590,50	56'447,93	12,09
18/02/2025	2'590,50	59'038,43	12,64
19/02/2025	2'590,50	61'628,92	13,19
20/02/2025	2'590,50	64'219,42	13,75
21/02/2025	2'590,50	66'809,91	14,30
24/02/2025	2'590,50	69'400,41	14,86
25/02/2025	2'590,50	71'990,91	15,41
26/02/2025	2'590,50	74'581,40	15,97
27/02/2025	2'590,50	77'171,90	16,52
28/02/2025	2'590,50	79'762,39	17,08
03/03/2025	2'590,50	82'352,89	17,63
04/03/2025	2'590,50	84'943,38	18,19
05/03/2025	2'590,50	87'533,88	18,74
06/03/2025	2'590,50	90'124,38	19,30
07/03/2025	2'590,50	92'714,87	19,85
10/03/2025	2'590,50	95'305,37	20,40
11/03/2025	2'590,50	97'895,86	20,96
12/03/2025	2'590,50	100'486,36	21,51
13/03/2025	2'590,50	103'076,86	22,07
14/03/2025	2'590,50	105'667,35	22,62
17/03/2025	2'590,50	108'257,85	23,18
18/03/2025	2'590,50	110'848,34	23,73
19/03/2025	2'590,50	113'438,84	24,29
20/03/2025	2'590,50	116'029,33	24,84
21/03/2025	2'590,50	118'619,83	25,40
24/03/2025	2'590,50	121'210,33	25,95
25/03/2025	2'590,50	123'800,82	26,51
26/03/2025	2'590,50	126'391,32	27,06
27/03/2025	2'590,50	128'981,81	27,61
28/03/2025	2'590,50	131'572,31	28,17
31/03/2025	2'590,50	134'162,80	28,72
01/04/2025	2'590,50	136'753,30	29,28
02/04/2025	2'590,50	139'343,80	29,83
03/04/2025	2'590,50	141'934,29	30,39
04/04/2025	2'590,50	144'524,79	30,94
07/04/2025	2'590,50	147'115,28	31,50
08/04/2025	2'590,50	149'705,78	32,05
09/04/2025	2'590,50	152'296,27	32,61
10/04/2025	2'590,50	154'886,77	33,16
11/04/2025	2'590,50	157'477,27	33,72
14/04/2025	2'590,50	160'067,76	34,27
15/04/2025	2'590,50	162'658,26	34,82
16/04/2025	2'590,50	165'248,75	35,38
17/04/2025	2'590,50	167'839,25	35,93
18/04/2025	2'590,50	170'429,74	36,49
21/04/2025	2'590,50	173'020,24	37,04
22/04/2025	5'583,88	178'604,12	38,24
23/04/2025	5'583,88	184'188,01	39,43
24/04/2025	5'583,88	189'771,89	40,63
28/04/2025	5'583,88	195'355,78	41,83
29/04/2025	5'583,88	200'939,66	43,02
30/04/2025	5'583,88	206'523,55	44,22
02/05/2025	5'583,88	212'107,43	45,41
05/05/2025	5'583,88	217'691,31	46,61
06/05/2025	5'583,88	223'275,20	47,80

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
07/05/2025	5'583,88	228'859,08	49,00
08/05/2025	5'583,88	234'442,97	50,19
09/05/2025	5'583,88	240'026,85	51,39
12/05/2025	5'583,88	245'610,73	52,58
13/05/2025	5'583,88	251'194,62	53,78
14/05/2025	5'583,88	256'778,50	54,98
15/05/2025	5'583,88	262'362,39	56,17
16/05/2025	5'583,88	267'946,27	57,37
19/05/2025	5'583,88	273'530,16	58,56
20/05/2025	5'583,88	279'114,04	59,76
21/05/2025	5'583,88	284'697,92	60,95
22/05/2025	5'583,88	290'281,81	62,15
23/05/2025	5'583,88	295'865,69	63,34
26/05/2025	5'583,88	301'449,58	64,54
27/05/2025	5'583,88	307'033,46	65,74
28/05/2025	5'583,88	312'617,34	66,93
29/05/2025	5'583,88	318'201,23	68,13
30/05/2025	5'583,88	323'785,11	69,32
03/06/2025	5'583,88	329'369,00	70,52
04/06/2025	5'583,88	334'952,88	71,71
05/06/2025	5'583,88	340'536,77	72,91
06/06/2025	5'583,88	346'120,65	74,10
09/06/2025	4'376,45	350'497,10	75,04
10/06/2025	4'376,45	354'873,55	75,98
11/06/2025	4'376,45	359'249,99	76,91
12/06/2025	4'376,45	363'626,44	77,85
13/06/2025	4'376,45	368'002,89	78,79
16/06/2025	4'376,45	372'379,34	79,73
17/06/2025	4'376,45	376'755,78	80,66
18/06/2025	4'376,45	381'132,23	81,60
19/06/2025	4'376,45	385'508,68	82,54
20/06/2025	4'376,45	389'885,13	83,47
23/06/2025	4'376,45	394'261,58	84,41
24/06/2025	4'376,45	398'638,02	85,35
25/06/2025	4'376,45	403'014,47	86,28
26/06/2025	4'376,45	407'390,92	87,22
27/06/2025	4'376,45	411'767,37	88,16
30/06/2025	4'376,45	416'143,81	89,10
01/07/2025	4'376,45	420'520,26	90,03
02/07/2025	4'376,45	424'896,71	90,97
03/07/2025	4'376,45	429'273,16	91,91
04/07/2025	4'376,45	433'649,60	92,84
07/07/2025	4'376,45	438'026,05	93,78
08/07/2025	4'376,45	442'402,50	94,72
09/07/2025	4'367,11	446'769,61	95,65
10/07/2025	4'367,11	451'136,72	96,59
11/07/2025	4'367,11	455'503,84	97,52
14/07/2025	4'367,11	459'870,95	98,46
15/07/2025	4'367,11	464'238,06	99,39
16/07/2025	945,48	465'183,54	99,60
17/07/2025	945,48	466'129,03	99,80
18/07/2025	945,48	467'074,51	100,00
Pescara, settembre 2024			
Il Tecnico			
F.to Geom. Cesare Ortolano - F.to Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio			
